



Relatório de Inspeção de Contratos de Pavimentação

RELATÓRIO DE ANÁLISE CONTRATUAL

Empresa contratada: SOLU'S ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 05.495.255/0001-96
Objeto: Análise de contratos de pavimentação vinculados a convênios federais no Município de Sena Madureira/AC
Período analisado: 2021 a 2025

1. Introdução

Este relatório apresenta as principais inconsistências e consistências verificadas na execução de convênios firmados com recursos federais para obras de pavimentação. A análise abrange contratos firmados com a empresa SOLU'S ENGENHARIA LTDA, apontando pendências documentais, falhas de gestão e possíveis riscos jurídicos, financeiros e técnicos.

2. Inconsistências Identificadas

Nº Convênio	Inconsistência	Risco Potencial	Observações
1 Todos os convênios	Reincidência de pendências documentais em todos os pedidos de pagamento	Pagamentos irregulares e responsabilização por falhas na execução	Documentos como cronograma, diário de obra, seguro garantia e relatórios fotográficos não foram apresentados
2 882781/2019	Devoluções de recursos (R\$ 285.031,85) por descompasso físico-financeiro	Danos ao erário e apuração de responsabilidade	Apuração do Ministério da Defesa gerou devoluções e obra paralisada sem justificativa
3 892602/2019	Obra paralisada sem justificativa da empresa	Risco de rescisão contratual e perda de recursos	Pagamento de mais de R\$ 600 mil sem comprovação adequada
4 896310/2019	Convênio expirado sem solicitação de prorrogação	Impossibilidade de continuidade da obra e prestação de contas	Seis pagamentos feitos com pendências e ausência de ação preventiva da



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



Nº Convênio	Inconsistência	Risco Potencial	Observações
5 897104/2019	Convênio vencido sem prorrogação	Risco de glosa total em eventual prestação de contas	prefeitura Último pagamento em 2023; sem continuidade formal da obra
6 906732/2020	Obra paralisada sem justificativa	Risco de inexecução parcial e devolução futura	Três pagamentos com pendências similares às anteriores

3. Consistências Identificadas

Nº Convênio	Aspecto Positivo	Observações
1 906732/2020	Até o momento, vigência ainda em curso	Possibilidade de correção, caso haja mobilização urgente da equipe gestora

4. Convênios detalhados

4.1 Convênio nº 882781/2019

- Objeto: Pavimentação em tijolo maciço em via urbana, incluindo drenagem e calçada
- Valor do convênio: R\$ 997.200,00
- Contrato nº: 151/2021
- Valor contratado: R\$ 936.716,75
- Situação: Em execução
- Data de término da vigência: 06/08/2025
- Pagamentos efetuados:
 - 1º pagamento: R\$ 350.064,86 (03/06/2022)
 - 2º pagamento: R\$ 246.546,75 (07/12/2022)
- Pendências documentais em ambos os pagamentos:
 - Solicitação de medição
 - Memória de cálculo
 - Cronograma executivo
 - Resumo financeiro
 - Relatório fotográfico
 - Diário de obra
 - Seguro garantia
- Inconsistência grave de localização da obra:
 - O projeto técnico especifica a execução em "Rua Dom Giocundo M. Grotti", com início nas coordenadas 9° 4'37,34"S / 68°40'9,71"O e término em 9° 4'38,35"S / 68°40'7,51"O. Contudo, essa rua **não existe**



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



no município, conforme verificação in loco e em bases cartográficas atualizadas.

- Da mesma forma, constam nos documentos outras vias denominadas "Rua Projetada" e "Rua Projetada 2", que também não existem fisicamente ou registralmente.
- Essas inconsistências comprometem a rastreabilidade, fiscalização e validação da execução da obra.
- Devoluções de recursos:
 - R\$ 97.882,92 (22/12/2023)
 - R\$ 187.148,93 (12/03/2024)
 - Total devolvido: R\$ 285.031,85
- Motivo das devoluções: Descompasso físico-financeiro constatado pelo Ministério da Defesa
- Status da obra: Paralisada sem justificativa da empresa

4.2 Convênio nº 892602/2019

- Objeto: Pavimentação de ruas
- Valor do convênio: R\$ 1.434.100,00
- Contrato nº: 100/2021
- Valor contratado: R\$ 1.410.108,94
- Situação: Em execução
- Data de término da vigência: 30/06/2025
- Pagamento efetuado:
 - 1º pagamento: R\$ 607.616,43 (06/12/2024)
- Pendências documentais:
 - Todos os documentos exigidos pela cláusula quarta, §2º
- Inconsistência grave de localização da obra: —
 - O projeto técnico especifica a execução em "Rua Projetada 02", com início nas coordenadas 9° 4'42,16"S / 68°41'27,58"W e término em 9° 4'45,31"S / 68°41'7,82"O. Contudo, essa rua **não foi executada em sua totalidade conforme projeto proposto**, relatório fotográfico em anexo
- Status da obra: Paralisada sem justificativa da empresa

4.3 Convênio nº 896310/2019

- Objeto: Pavimentação asfáltica de 1.200 metros
- Valor do convênio: R\$ 956.273,33
- Contrato nº: 059/2021
- Valor contratado: R\$ 813.509,68
- Situação: Aguardando prestação de contas
- Data de término da vigência: 31/07/2024 (não prorrogado)
- Pagamentos efetuados:



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



- 1º: R\$ 272.157,04 (20/05/2022 e 12/07/2022)
- 2º: R\$ 57.288,07 (06/12/2022)
- 3º: R\$ 73.235,55 (15/12/2022)
- 4º: R\$ 95.634,64 (22/02/2023)
- 5º: R\$ 90.183,06 (08/08/2023)
- 6º: R\$ 38.555,63 (21/02/2024)
- Pendências documentais recorrentes em todos os pagamentos
- Status da obra: Obra paralisada e vencimento do convênio sem prorrogação solicitada pela prefeitura

4.4 Convênio nº 897104/2019

- Objeto: Pavimentação asfáltica em bairros
- Valor do convênio: R\$ 860.706,00
- Contrato nº: 085/2021
- Valor contratado: R\$ 787.042,09
- Situação: Aguardando prestação de contas
- Data de término da vigência: 30/05/2024
- Pagamentos efetuados:
 - 1º: R\$ 334.268,02 (05/07/2022)
 - 2º: R\$ 38.509,75 (22/02/2023)
- Pendências documentais em ambos os pagamentos
- Status da obra: Obra paralisada e vencimento sem prorrogação formal

4.5 Convênio nº 906732/2020

- Objeto: Pavimentação asfáltica com meio-fio e sarjeta
- Valor do convênio: R\$ 960.980,00
- Contrato nº: 044/2022
- Valor contratado: R\$ 863.193,24
- Situação: Em execução
- Data de término da vigência: 29/06/2025
- Pagamentos efetuados:
 - 1º pagamento: R\$ 188.103,39 (16/07/2024)
 - 2º pagamento: R\$ 74.075,38 (06/09/2024)
 - 3º pagamento: R\$ 77.463,73 (20/12/2024)
- Pendências documentais em todos os pagamentos:
 - Solicitação de medição
 - Memória de cálculo da medição
 - Resumo financeiro
 - Relatório fotográfico
 - Diário de obra
 - Seguro garantia
- Inconsistência na execução física da obra:



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



- Consta no projeto o trecho da **Travessa do Pólo**, com as seguintes coordenadas:
 - Início: 9° 4'36.25"S / 68°41'8.38"W
 - Fim: 9° 4'46.12"S / 68°41'10.96"W
- Após vistoria in loco, com registro fotográfico anexo ao relatório técnico, constatou-se que esse trecho não foi executado.
- Como não há relatório fotográfico de medição nem memória de cálculo nos processos de pagamento, não é possível afirmar com segurança se os recursos financeiros cobriram esse trecho não executado, o que configura risco de pagamento indevido e prejuízo ao erário.
- Status da obra: Paralisada sem justificativa formal da empresa

5. Conclusão

A análise demonstrou **graves fragilidades documentais, ausência de justificativas para paralisações** e falhas no acompanhamento da execução contratual. Ressalta-se a **reincidência de pendências** em todos os convênios analisados, o que pode comprometer a prestação de contas e gerar responsabilizações administrativas, civis e criminais.

Sena Madureira – AC, 11 de junho de 2025.

Eng. Richarllison Araujo
CREA - AC 22204D

Richarllison Gabriel da Silva Araujo
Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior
Dec. nº 089/2025
Engenheiro Civil



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:

Sena Madureira

Data: 04/06/2025

Objeto:

Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos

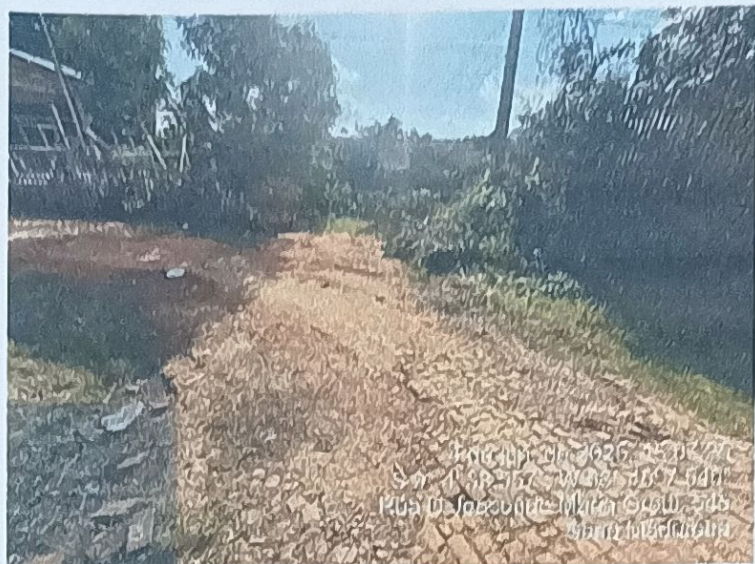


Foto 01

Rua:	Rua Dom Giocundo (R.Doze)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco

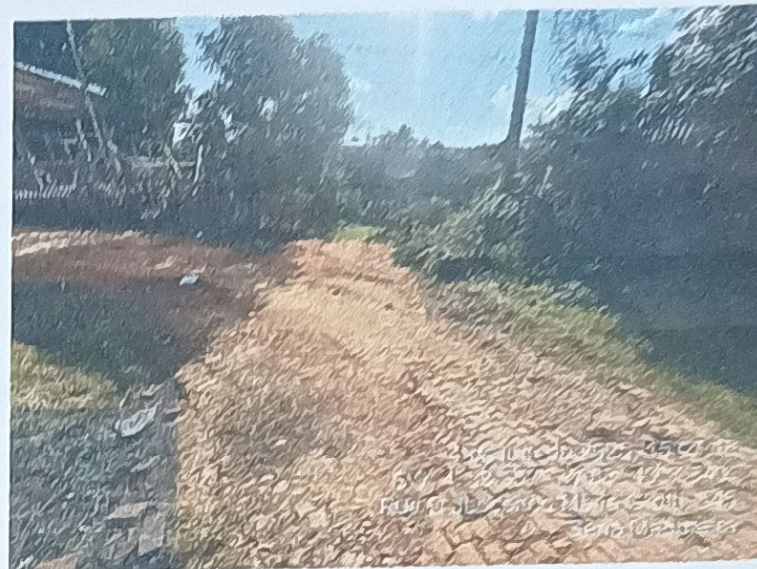


Foto 02

Rua:	Rua Dom Giocundo (R.Doze)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco

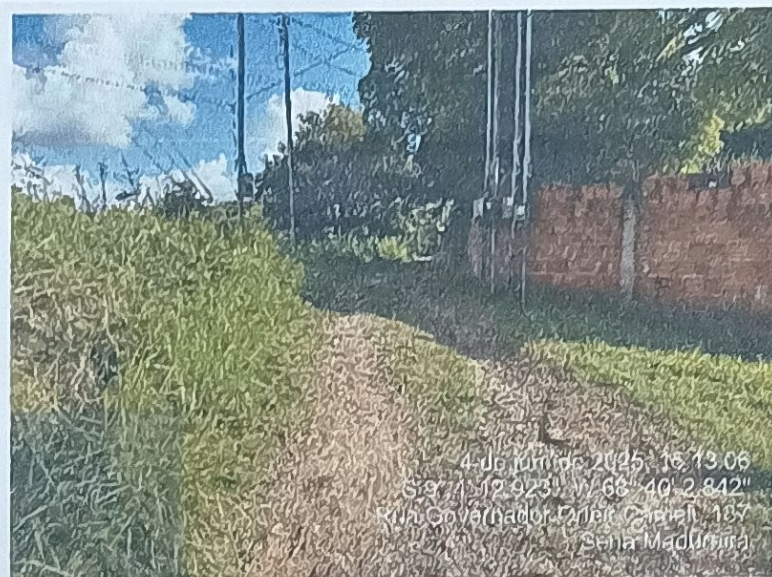


Foto 03

Rua:	Rua Projetada
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco



Foto 04

Rua:	Rua Projetada
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco

Eng. Richardlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de Inspeção de contratos

Data: 04/06/2025

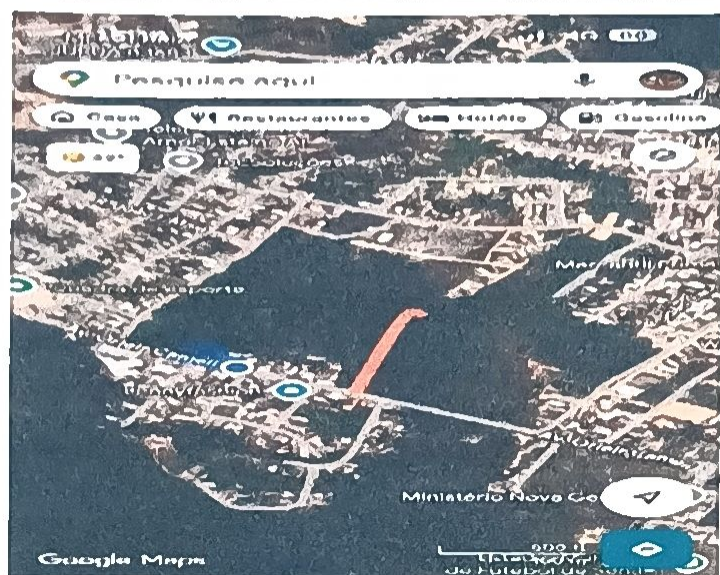


Foto 05

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua Inexistente conforme verificação in loco

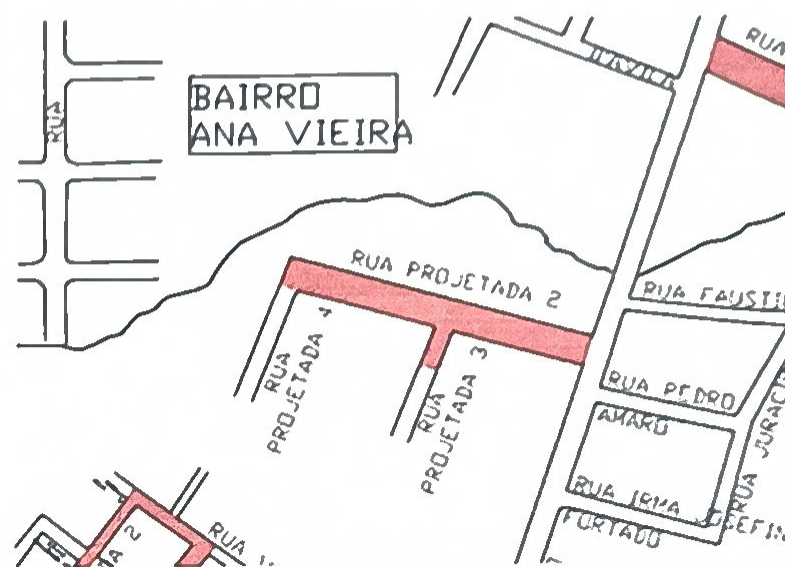


Foto 06

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco



Foto 07

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação In loco

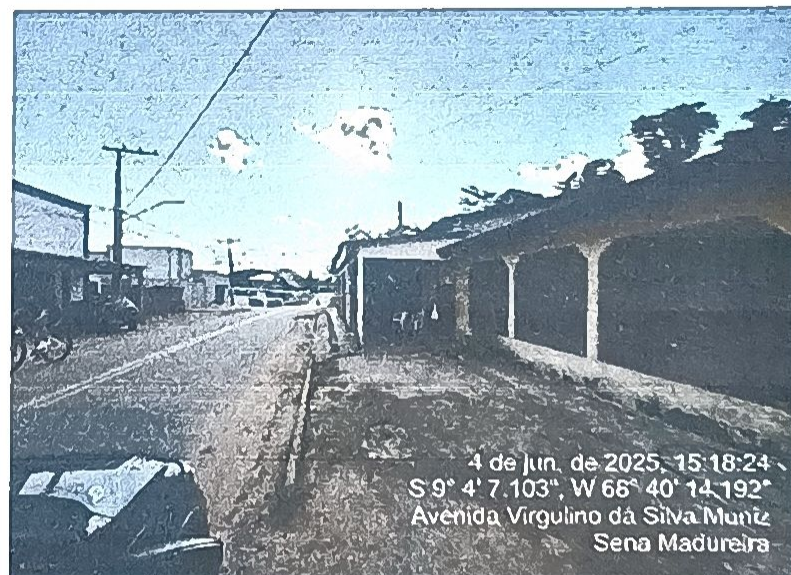


Foto 08

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua inexistente conforme verificação in loco

Eng. Richarlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:

Sena Madureira

Data: 04/06/2025

Objeto:

Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos



Foto 09

Rua:	Rua Santa Helena
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 10

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 11

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 12

Rua:	Rua Projetada 2
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

Eng. Richarllison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:

Sena Madureira

Data: 04/06/2025

Objeto:

Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos

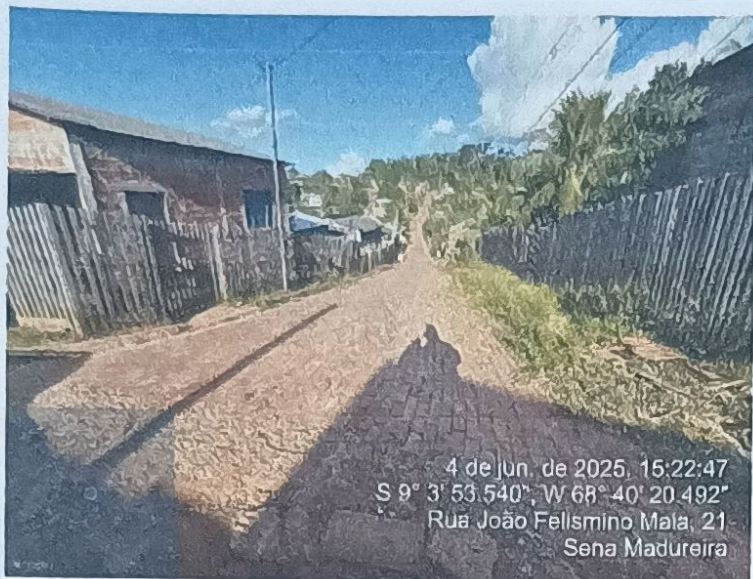


Foto 13

Rua:	João Felismino Maia
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

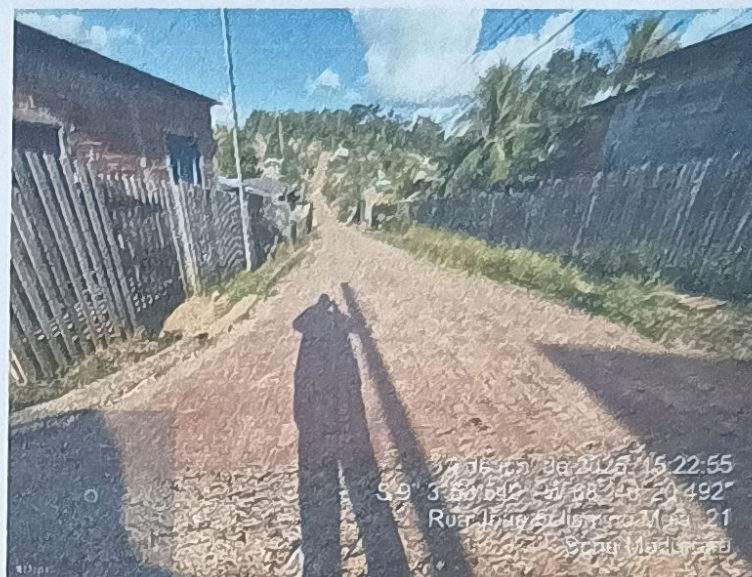


Foto 14

Rua:	João Felismino Maia
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 15

Rua:	João Felismino Maia
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 16

Rua:	João Felismino Maia
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

Eng. Richarllison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos

Data: 04/06/2025

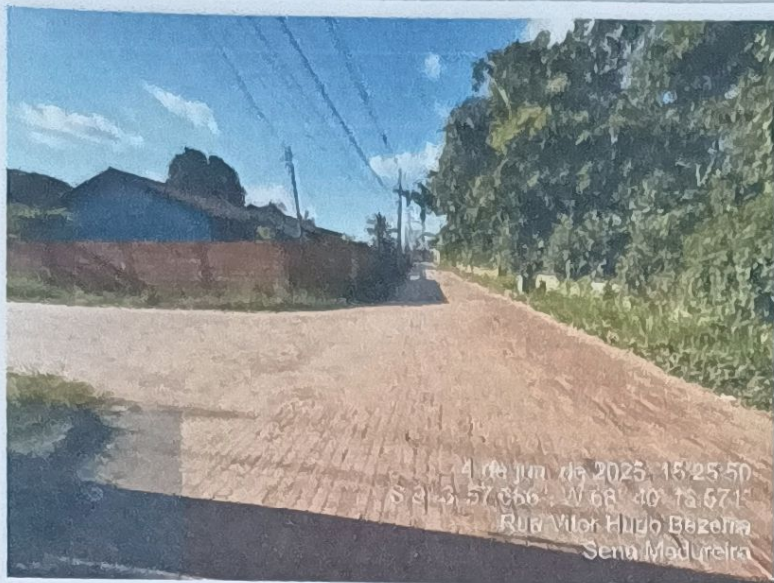


Foto 17

Rua:	Vitor Hugo Bezerra
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

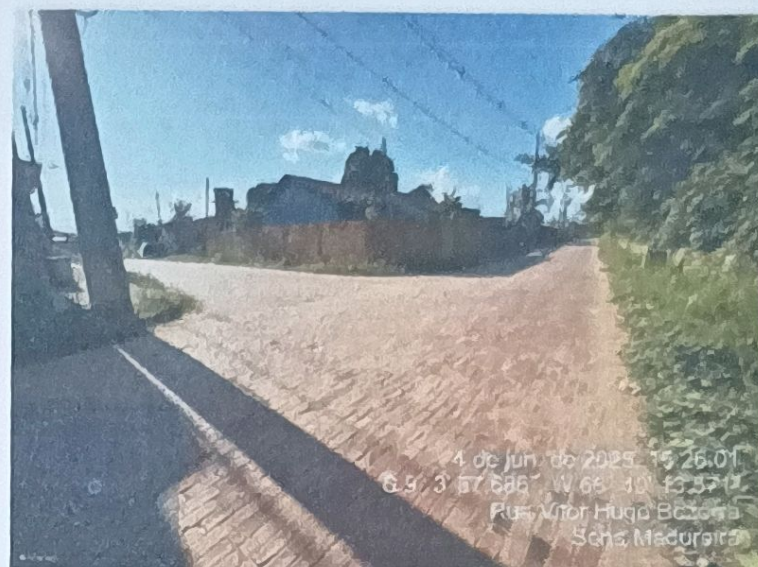


Foto 18

Rua:	Vitor Hugo Bezerra
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 19

Rua:	Vitor Hugo Bezerra
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 20

Rua:	Vitor Hugo Bezerra
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

Eng. Richarlilson Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:

Sena Madureira

Objeto:

Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos

Data: 04/06/2025

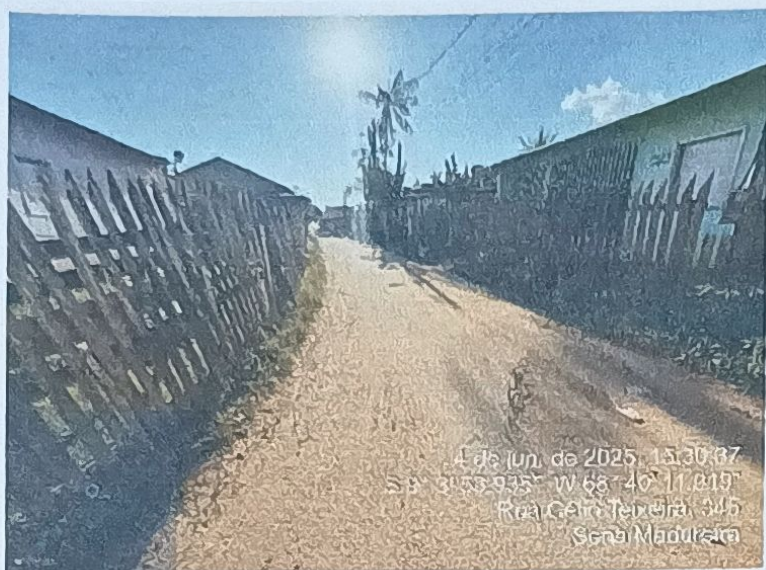


Foto 21

Rua:	Projetada 2 (esquina com rua Vitor Hugo)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ

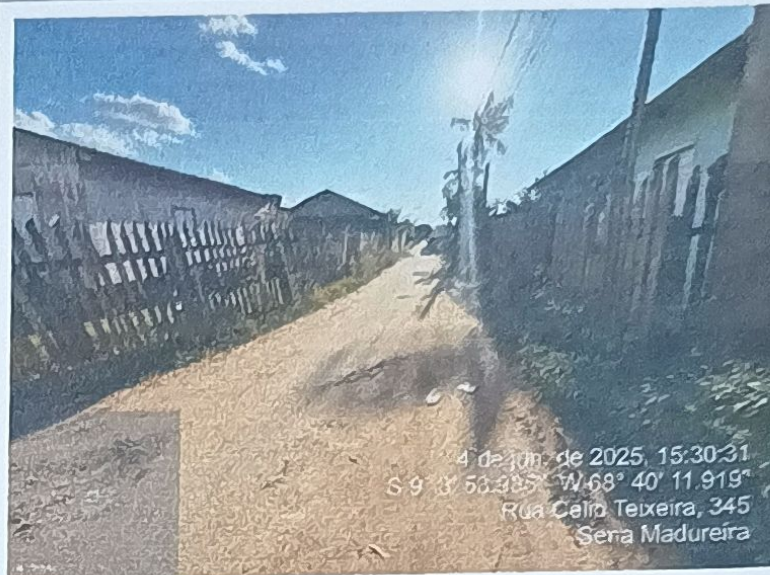


Foto 22

Rua:	Projetada 2 (esquina com rua Vitor Hugo)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ

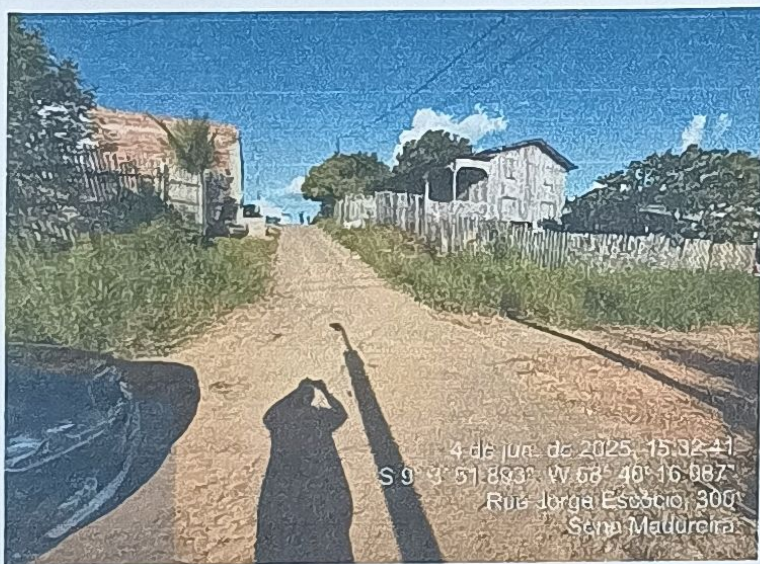


Foto 23

Rua:	Projetada 2 (esquina com rua Vitor Hugo)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ

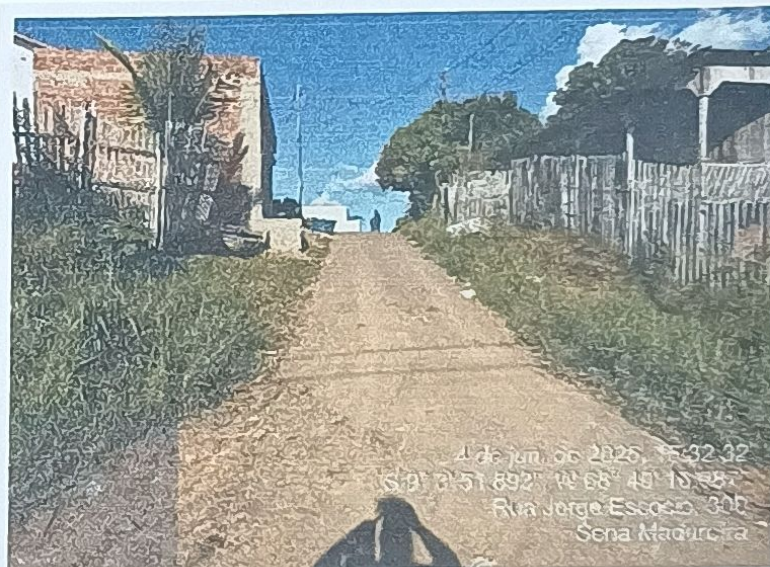


Foto 24

Rua:	Projetada 2 (esquina com rua Vitor Hugo)
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ

Eng. Richarlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de Inspeção de contratos

Data: 04/06/2025



Foto 25

Rua:	Francisca Alves
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

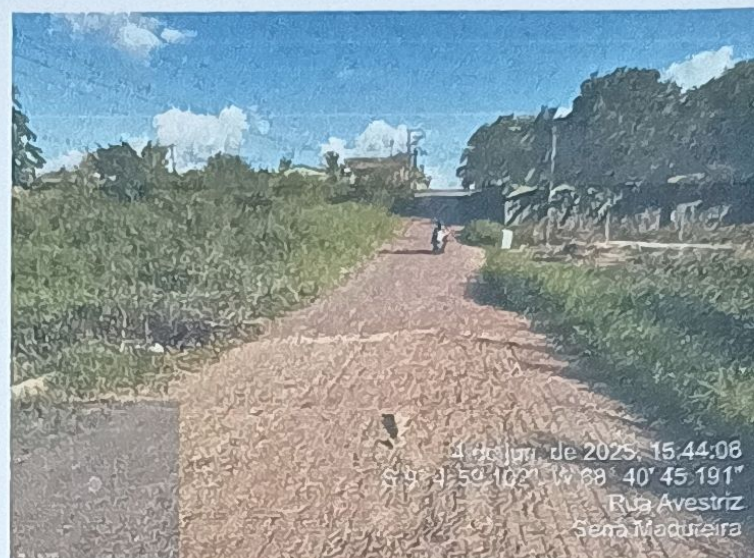


Foto 26

Rua:	Francisca Alves
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico



Foto 27

Rua:	Francisca Alves
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

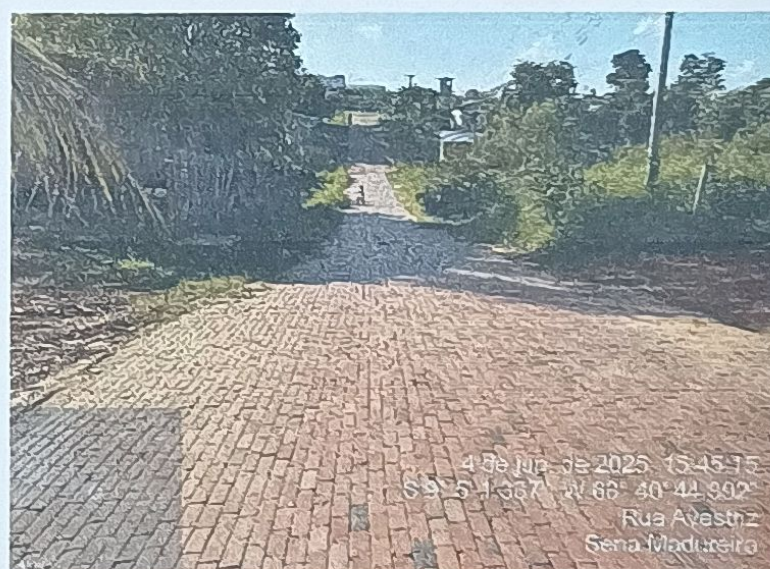


Foto 28

Rua:	Francisca Alves
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em tijolo cerâmico

Eng. Richarlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de Inspeção de contratos

Data: 04/06/2025



Foto 29

Rua:	Rua Projetada 2 (Polo)
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ, Trecho não executado em totalidade conforme previsto em projeto

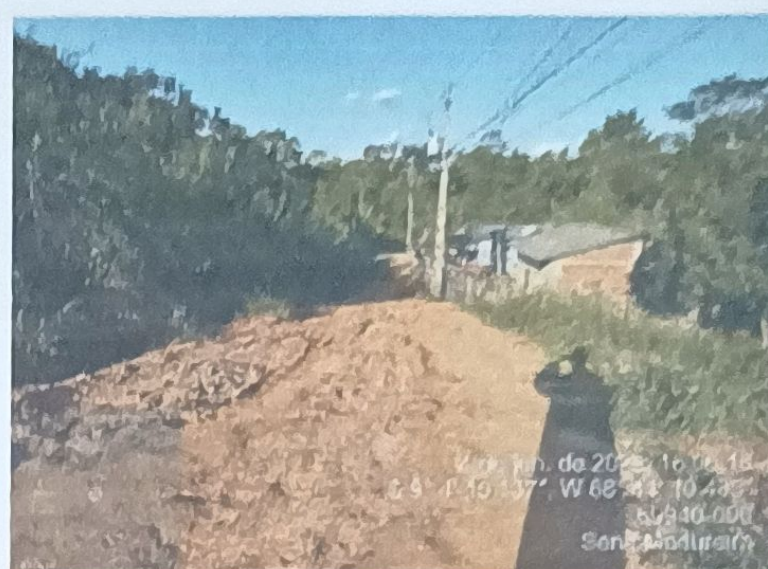


Foto 30

Rua:	Rua Projetada 2 (Polo)
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Parte Faltante de execução, conforme previsto em Projeto



Foto 31

Rua:	Rua Projetada 2 (Polo)
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ



Foto 32

Rua:	Rua Projetada 2 (Polo)
Contrato:	892602 - 2019
Descrição:	Rua pavimentada em CBUQ

Eng. Richarlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de Inspeção de contratos

Data: 04/06/2025

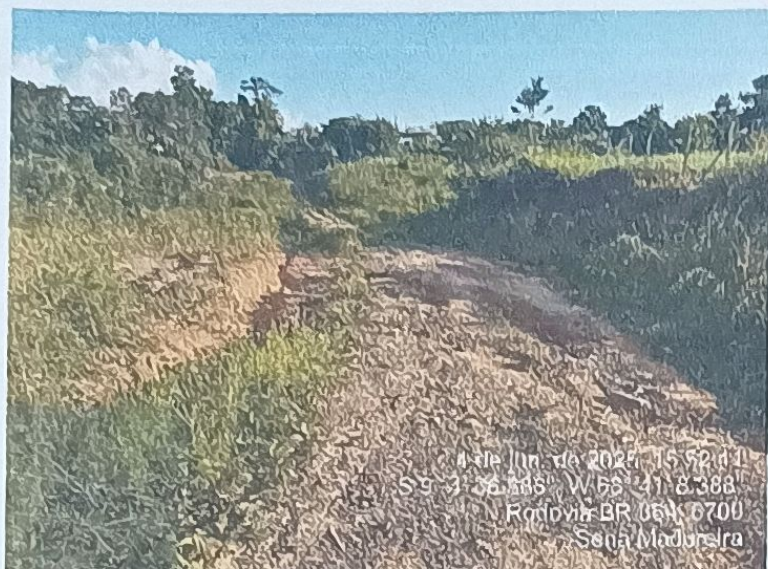


Foto 33

Rua:	Travessa do Polo
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, porém não executada



Foto 34

Rua:	Travessa do Polo
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, porém não executada

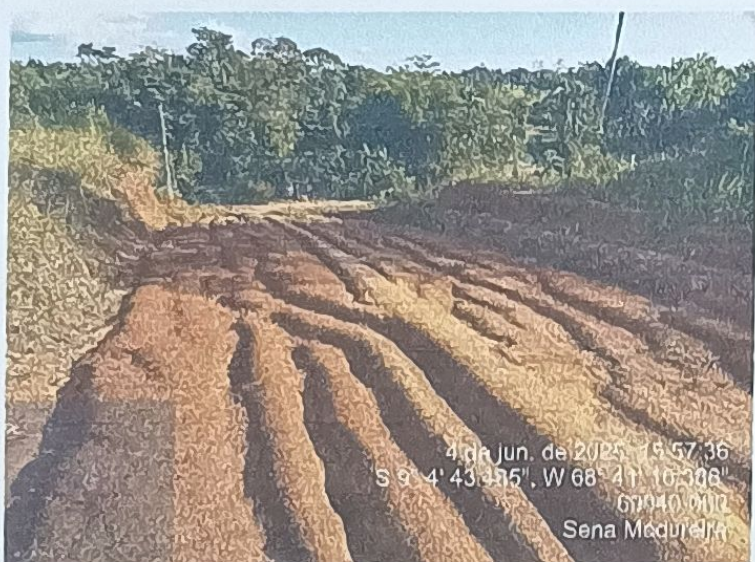


Foto 35

Rua:	Travessa do Polo
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, porém não executada

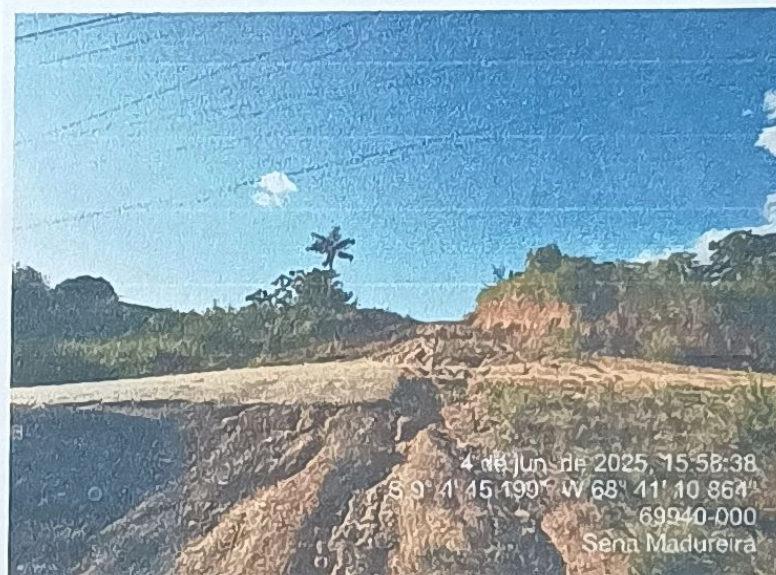


Foto 36

Rua:	Travessa do Polo
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, porém não executada

Eng. Richarlison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RAMAIS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:
Objeto:

Sena Madureira
Relatório fotográfico situacional de inspeção de contratos

Data: 04/06/2025

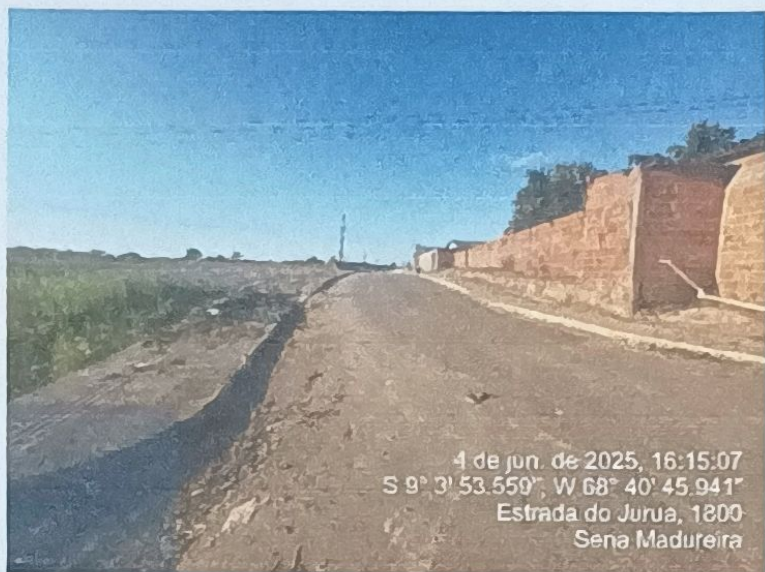


Foto 37

Rua:	Projetada 15
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, Meio fio e Sarjeta



Foto 38

Rua:	João Felismino Maia
Contrato:	882781 - 2019
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, Meio fio e Sarjeta

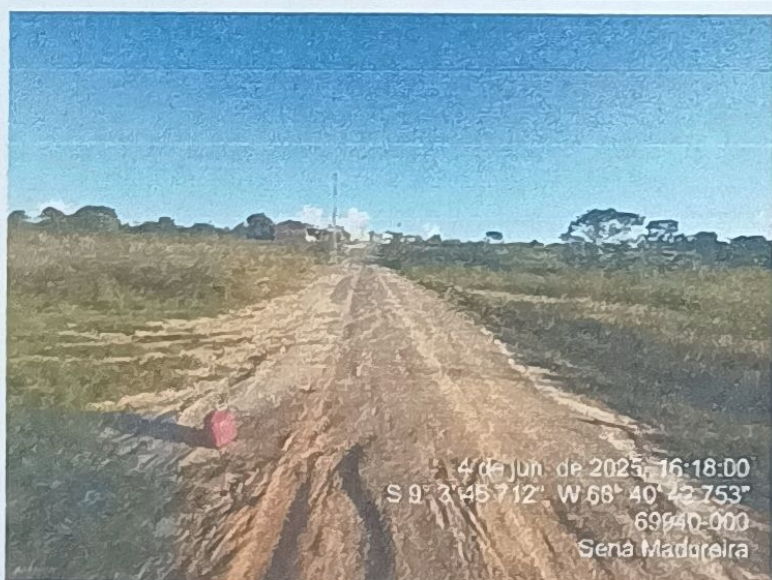


Foto 39

Rua:	Projetada 15
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, Meio fio e Sarjeta, porém não foi executada em sua totalidade do previsto em projeto



Foto 40

Rua:	Projetada 15
Contrato:	906732 - 2020
Descrição:	Rua prevista para execução de em CBUQ, Meio fio e Sarjeta, porém não foi executada em sua totalidade do previsto em projeto

Eng. Richarllison Araujo
CREA - AC 22204D

Responsável
